


工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成池工事
 工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

受注者：御涌池組
 現場代理人：[REDACTED]

週間工程

工種	単位	数量	先週							今週							来週							備考
			6/24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	7/1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	
準備工	式	1	原工計画書池書作成							書類作成							書類作成							
伐採範囲確認	式	1				13時																		
立入禁止	式	1																						
仮設工	式	1																						
仮囲い工	式	1																						
車両搬出入予定 ・その他	10t車(トラック) 数板 セルブ(BH回送車) 3t・4t車 コンクリート、鉄板																							
行事予定																								

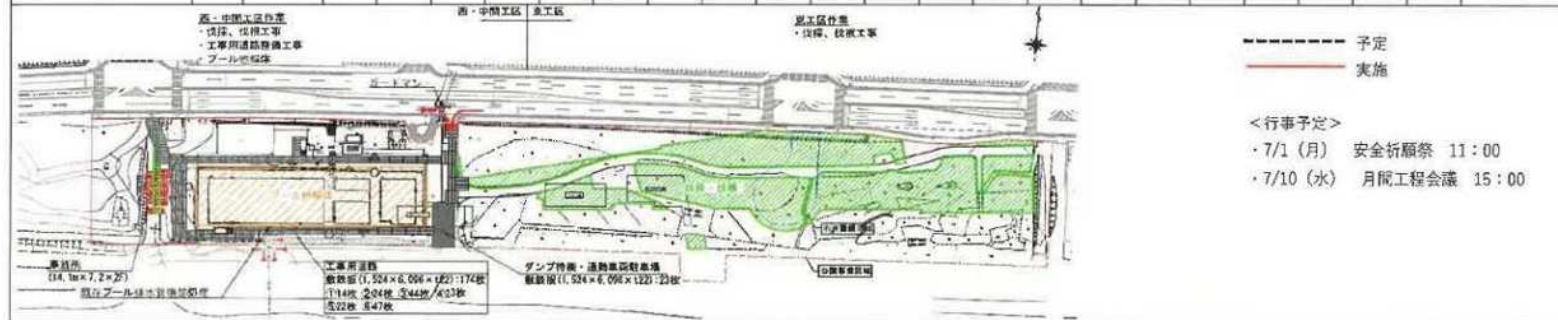

工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成他工事

工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

週間工程

平塚Seaside Park 共同事業体

受注者：榊鴻池組

現場代理人：[REDACTED]

工種	先週							今週							来週							備考						
	7/15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8/1	2	3	4							
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
東工区・西工区	準備工	休工	書類作成				休工	休工					書類作成	休工	休工						書類作成				事務所設置	休工	休工	
	伐採・草刈り		東工区草刈り・伐採																									
	撤去工		仮設フェンス撤去(西工区)																									
	仮設工		工事用道路工(東工区)																									
	仮囲い工		西工区→東工区側																									
車両搬出入予定 ・その他									AM2台	AM2台	AM2台																10t車	
									AM1台																		セルフ(BH回送車)	
		AM4台																									3t・4t車	
																											1台	クレーン
行事予定			週間工程会議	定例会議																								



工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成他工事

平塚Seaside Park 共同事業体

工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

週間工程

髙橋池組

現場代理人：[REDACTED]

工種	先週							今週							来週							備考		
	22	23	24	25	26	20	21	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
東工区・西工区	準備工	書類作成					休工	休工	書類作成					休工	休工	書類作成					休工	休工		
	伐採・草刈り		伐採		伐木搬出			伐採							伐採									
	撤去工	緑石撤去（東工区）プール部ゴム防水材撤去（西工区）							防水シート撤去（西工区）							プール部コンクリート撤去（西工区）								
	仮設工	工事用道路工（東工区）							工事用道路工（東工区）							工事用道路工（東工区）								
	仮囲い工	東工区→西工区国道側							西工区国道側							ゲート設置							※134号残存樹林部分は対応調整中	
	プール排水部 試掘																							
	不法投棄物																							市の立会調整後決定
車両搬出入予定 ・その他		2台		1台	3台					AM 6台													10 t 車 セルフ（BH回送車） 3 t・4 t 車	
行事予定			週間工程 会議	定例会議						週間工程 会議	定例会議					月間工程 会議	定例会議					トラクタ・クレーン		



工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成他工事

平塚Seaside Park 共同事業体

工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

週間工程

機滝池組

現場代理人： XXXXXXXXXX

工種	先週								今週								来週								備考
	29	30	31	8/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
東工区・西工区	準備工	書類作成					休	休	書類作成					休	休	休	休	休	休	休	休	休			
	伐採・草刈り	伐採						伐採																	
	撤去工	防水シート撤去(西工区)						プール部コンクリート撤去(西工区)																	
	仮設工	工事用道路工(東工区)						工事用道路工(東工区)																	
	仮囲い工	西工区国道側			ゲート設置						東工区国道側												※134号残存樹林部分は対応調整中		
	不法投棄物																						市の立会調整後決定		
															1日に2回 巡回点検 (AM9~12時、PM2~5時)										
車両搬出入予定 ・その他	5台(伐木)	5台(伐木)	AM5台(ハウス)、6台(伐木)																			10t車			
	1台																					セルフ (BH回送車)			
	トレーラー1台		クレーン1台	トレーラー1台																		3t・4t車			
行事予定			週間工程会議	定例会議						月間工程会議	定例会議											トレーラー・クレーン			
<p> 予定 実施 </p> <p> <行事予定> ・7/31 週間工程会議 ・8/7 月間工程会議・安全パトロール ・8/1、8/8 定例会議 ・7/31 13時 伐採範囲確認 ・8/7 伐採範囲確認 </p>																									

工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成他工事

平塚Seaside Park 共同事業体

工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

週間工程

榑鴻池組

現場代理人：[REDACTED]

工種	先週							今週							来週							備考		
	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7	8			
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
東工区・西工区	準備工	書類作成					休工	休工	書類作成					休工	休工	書類作成						休工	休工	
	伐採・草刈り	プール部コンクリート撤去(西工区)							プール部コンクリート撤去(西工区)							プール部コンクリート撤去(西工区)								
	撤去工	プール部コンクリート撤去(西工区)							プール部コンクリート撤去(西工区)							プール部コンクリート撤去(西工区)								
	仮設工	工事田道路工(西工区)							工事田道路工(西工区) ダンプ用泥落とし装置							切土(東工区)								
	造成工事																							
	仮囲い工																							※134号残存樹林部分は 対応調整中
車両搬出入予定 ・その他				1																			10t車	
				1						3													セルフ(BH回送車)	
	1																						3t・4t車	
行事予定			週間工程 会議	定例会議						週間工程 会議							週間工程 会議	定例会議					トレーラ	



- - - - - 予定
 ———— 実施
- <行事予定>
- ・8/21、8/28、9/4 週間工程会議
 - ・8/27 15時30分～16時30分 津田副市長現場視察
 - ・9/4 安全パトロール
 - ・9/5 定例会議

工事件名：湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業のうち造成他工事

平塚Seaside Park 共同事業体


工期：令和6年7月1日～令和7年10月14日

週間工程

榑鴻池組

現場代理人： XXXXXXXXXX

工種	先週							今週							来週							備考	
	26	27	28	29	30	31	9/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
東 工 区 ・ 西 工 区	準備工	書類作成・丁張					休	休	書類作成・丁張					休	休	書類作成・丁張					休	休	
	撤去工	プール部コンクリート撤去(西工区 大プール) 解体・小割・搬出(48m3/日)							プール部コンクリート撤去(西工区 大プール) 解体・小割・搬出(48m3/日)							プール部コンクリート撤去(西工区 中プール) 解体・小割・搬出(48m3/日)							
	仮設工	工事用道路工(西工区) ダンプ用泥後とし装置																					
	造成工							切土(東工区)断面No.27~No.25 200m3/日							切盛土・基面整正(東工区)断面No.25~No.23 盛土(西工区)断面No.8~No.9 200m3/日								
車両搬出入予定 ・その他		12	12	12	12	12		12	12	12	12	12		12	12	12	12	12		10 t 車コンガラ			
								1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		10 t 車残土場内運搬			
																				3 t ・ 4 t 車			
																				トラクタ			
行事 予定			週間工程 会議					月間工程 会議		定例会議				週間工程 会議									

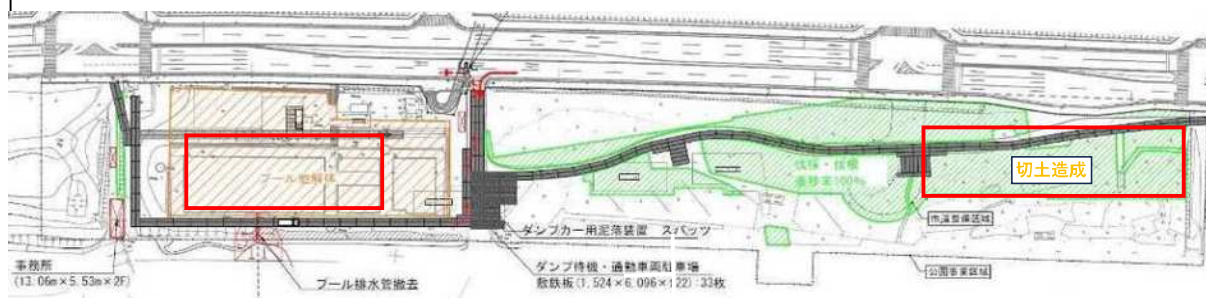

- - - - - 予定
 ———— 実施
- < 行事予定 >
- ・ 8/27 15時30分～16時30分 津田副市長現場視察
 - ・ 8/28、9/11 週間工程会議
 - ・ 9/4 月間工程会議
 - ・ 9/4 安全パトロール
 - ・ 9/5 定例会議
